


# 夜間作業の実施について

- 工事現場における夜間(18時30分以降、翌日7時まで)の作業について、7月17日以降、実施する予定です。

※外周部の鋼矢板工事:12月末まで、仮設調整池の鋼矢板等工事及び隊庁舎部の地盤改良工事:8月末まで

- 夜間作業時の対策は以下のとおり。
  - ・使用重機は低騒音・低振動型を使用し、不要な空ぶかしは行いません。
  - ・鋼矢板の設置は、騒音・振動の少ない工法により実施します。
  - ・照明は、外部に向けて照射しないよう向き、角度に留意します。
  - ・作業に必要な合図を行う際は無線機を使用し、大きな声での作業を控えます。
  - ・作業中は振動、騒音の測定を行います。

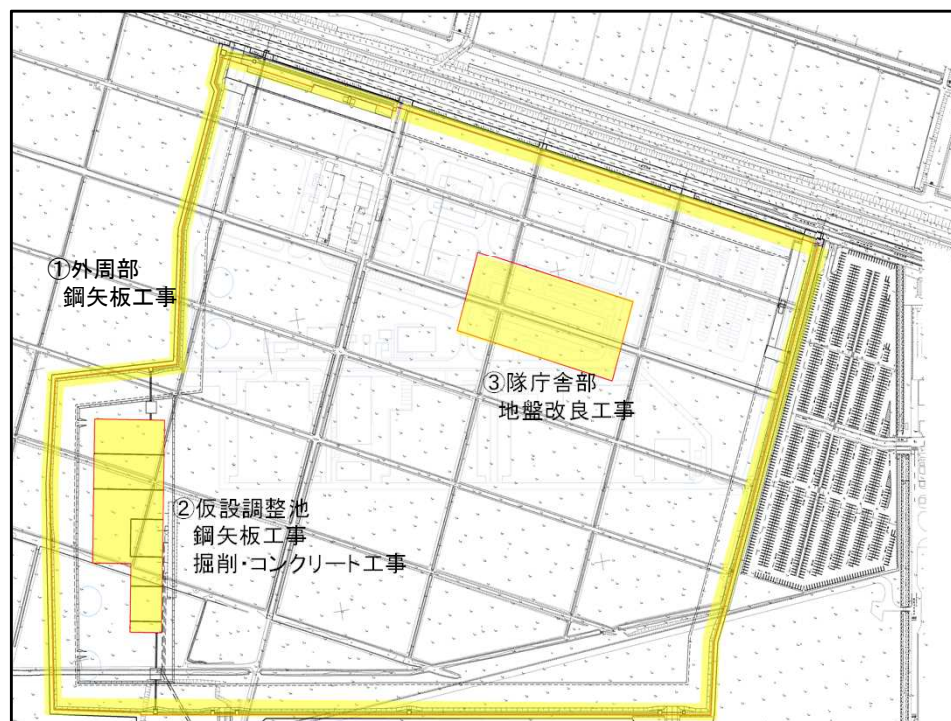

夜間工事 施工範囲平面図



主な施工重機

## 月間工程スケジュール

項目等			7月																												備考		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
造成工事	土砂運搬	8:30~18:30																													~2024.8月末		
		18:30~22:00																															
		22:00~翌6:00																															
仮設調整池工事																		鋼矢板圧入・掘削													~2023.8月末		
																		鋼矢板圧入・掘削													~2023.8月末		
仮設水路工事			土工・管布設工・柵設置工																												~2023.9月末		
県道部工事			進入路造成																												~2023.8月末		
取壊し等撤去工事						既設構造物撤去																									~2023.9月末		
仮設工事																		鋼矢板圧入													~2023.12月末		
																		鋼矢板圧入													~2023.12月末		
隊庁舎地区地盤改良工事						整地・地盤改良																									~2023.8月末		
						整地・地盤改良																									~2023.8月末		
共通仮設工・仮設準備工			濁水処理設備維持管理																												~2025.6月末		
												土堰堤・仮囲い																					

※現場状況及び天候等により、スケジュールを変更することがあります。

➡ 7:00~18:30の作業     
 ➡ 18:30~7:00の作業
